

Informe de Terminación



**PROYECTO VIVIENDAS
SALUDABLES DE PALLCAPAMPA**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Viviendas Saludables de Pallcapampa

Institución solicitante

Sindicato Agrario de la Comunidad de
Pallcapampa

Responsable

Eusebio Jallurana Flores

Rafael Segales Arratia



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Larecaja


Municipio: Sorata

Comunidad: Pallcapampa

Tiempo de viaje: 5 horas

Distancia: 157 Kms.

Beneficiarios: 17 Familias

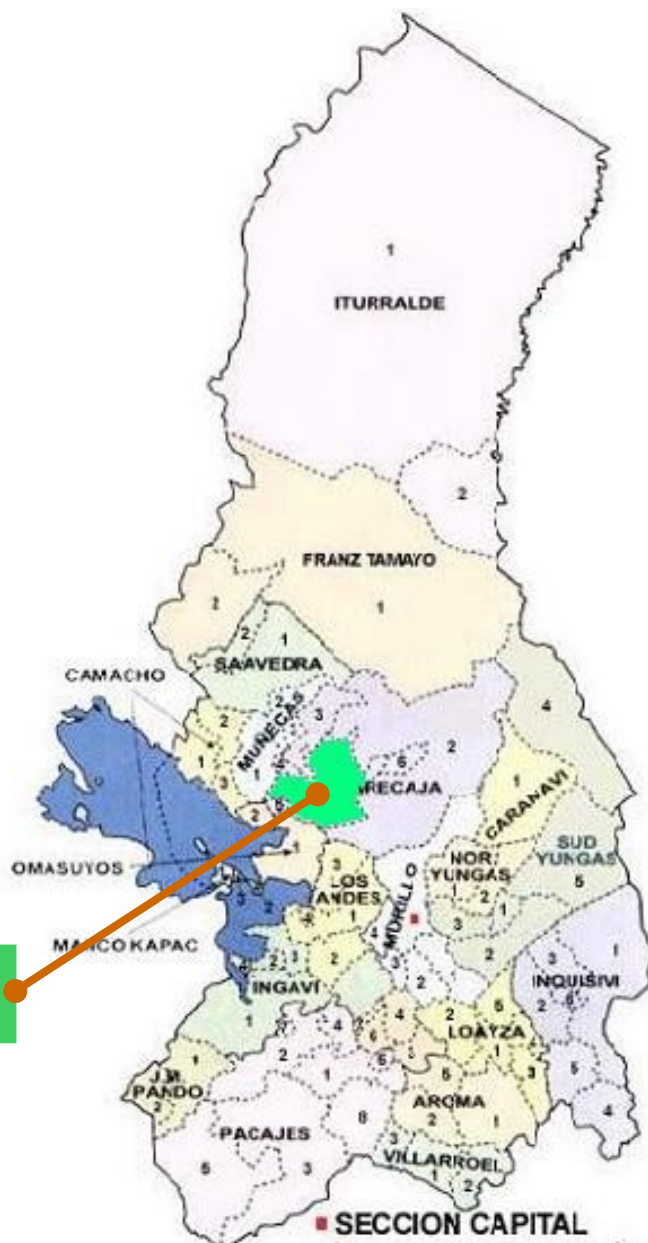

Sorata



TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio:	Septiembre 2004	Fecha de finalización:	Mayo 2005
-------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------

Aporte QBL: \$us 5885.00

Aporte Local: \$us 1325.06

Costo Total: \$us 7210.06



RESULTADO 1



Planificado

Al finalizar el 4to. Mes, se implementarán 19 letrinas (17 familiares y 2 comunales) beneficiando a igual número de familias.

Logrado

En un tiempo de 8 meses, con la participación comunitaria, se han implementado 17 letrinas familiares y 1 comunal, beneficiando a 17 familias de la comunidad de Pallcapampa.



RESULTADO 2



Planificado

Al finalizar el 5to. mes, se capacitarán 19 personas mediante 2 módulos (prevención de enfermedades diarreicas y mantenimiento de letrinas).

Logrado

Hasta el 8vo mes se han capacitado las 17 familias mediante 2 módulos (1 en la construcción de las letrinas y 1 en prevención de enfermedades diarreicas, como hábitos de higiene, y cuidado del medio ambiente).



OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Disminuir en un 3% el número de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas por cada 1000 menores de 5 años.

Logrado

La tasa de diarreas en menores de 5 años, en el muestro realizado en Noviembre 2004, (2 meses de comenzado la construcción de las letrinas) nos dio un resultado de 0%. Lo que implica que es necesario realizar otra evaluación en la gestión de 2006.



OBJETIVO Y META

PROPOSITO

Planificado

Al finalizar el presente proyecto, el 100% de las familias de Pallcapampa contarán con servicios de saneamiento adecuados.

Logrado

Al finalizar el proyecto en el año 2005, el 100% de las familias de Pallcapampa cuenta con el servicio sanitario en sus hogares.



IMPACTOS

ECONOMICO

El uso de letrinas, disminuye las enfermedades, y por ende genera mayores ahorros en gastos en atención en salud y hospitalarios.



IMPACTOS

SOCIAL



La implementación de letrinas con ducha, mejora las condiciones de habitabilidad.

Habrà la disminuci3n de casos de EDAs en ni1os menores de 5 a1os principalmente.

Los ni1os tendr3n mejores condiciones de aseo y mejorar3n su capacidad de aprendizaje y autoestima.

IMPACTOS

TECNOLOGIC



Las letrinas están construidas en fundaciones sólidas, solo las aguas derivadas del baño se depositan en el pozo séptico, las aguas de la ducha y lavandería se destinan a la intemperie, en este sentido la durabilidad del pozo séptico será para mayor tiempo hasta su renovación.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

La recolección de las heces en un pozo séptico, evita la contaminación de los terrenos cultivables y agua de riego.





COMENTARIOS ADICIONALES

- Las familias de Pallcapampa han trabajado activamente para poseer sus letrinas ya terminadas, para que pueda cubrir los requerimientos y necesidades de habitabilidad.
- La comunidad ha respondido a las expectativas, aunque por ser un grupo relativamente pequeño, el responder a las exigencias de trabajo produjo un gran desgaste en ellos.
